



## **LAUDO DE VISTORIA Nº 030/2020**

### **1 - INTERESSADO:**

O solicitante do presente Laudo de Vistoria é a Prefeitura do Município de Mafra.

### **2 - DESCRIÇÃO DO OBJETO:**

O objeto da presente vistoria é a obra de Reforma EMEF Campo da Lança, localizada na Rua Pioneiro Emilio Henning esq. Rua Pedro Liebl, bairro Campo da Lança.

### **3 - OBJETIVO:**

O presente laudo de vistoria tem por objetivo verificar e atestar a execução da obra de Reforma da EMEF Campo da Lança, construída pela empresa Implantest Construtora Eireli – EPP, realizada pela contratada conforme o Processo Licitatório nº 273/2019 Modalidade Tomada de Preços nº 011/2019 Constrato nº049/2019.

### **4 - VISTORIA:**

Para esta medição, apresentam-se concluídos os serviços conforme nota fiscal e planilha anexa.

O presente laudo foi realizado in loco na data de 07/02/2020 às 14:00 horas, pelo servidor Cassiano José Corrêa, de acordo com a planilha anexa.

**Valor total da obra contratada: R\$ 229.843,01 (Duzentos e vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e um centavo).**

1º Medição: de R\$ 93.734,67 (noventa e três mil, setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos) corresponde a 40,78% dos valores inicialmente contratados.

2º Medição: de R\$ 16.797,47 (Dezesseis mil, setecentos e noventa e sete reais e quarenta e sete centavos) correspondente a 7,31% dos valores inicialmente contratados.

3º Medição: de R\$ 24.540,48 (Vinte e quatro mil, quinhentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos) correspondente a 10,68% dos valores inicialmente contratados.

4º Medição: de R\$ 10.307,26 (Dez mil, trezentos e sete reais e vinte e seis centavos) corresponde a 4,48% dos valores inicialmente contratados.

5º Medição: de R\$ 9.320,82 (Nove mil trezentos e vinte reais e oitenta e dois centavos) correspondente a 4,06% dos valores inicialmente contratados.

**6º Medição: de R\$ 25.054,50 (Vinte e cinco mil e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) correspondente a 10,90% dos valores inicialmente contratados.**



OBS: Como foi constatado a ausência de dois pilares previsto em projeto e que já foi pago em medição anterior, foi necessário realizar a glosa na medição (item 6.9) para suprimir o valor já pago pela pilar (valor de concretagem e armação de um pilar totalizando o valor de R\$178,40), até que a situação seja resolvida.

Obra executada corresponde a 78,21% dos valores inicialmente contratados.

**VALOR TOTAL PARA A 6ª MEDIÇÃO**

R\$ 25.054,50 (Vinte e cinco mil e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) correspondente a 10,90% dos valores inicialmente contratados.

  
\_\_\_\_\_  
Prefeitura Municipal de Mafra  
Casiano José Corrêa  
Engenheiro Civil  
CREA 48526-8  
Matrícula 25305-0


Mafra, 07 de fevereiro de 2020.



## FOTOS



1- Quadra – Serviços medidos: malha de aço CA-60, Piso de concreto, Pilares metálicos

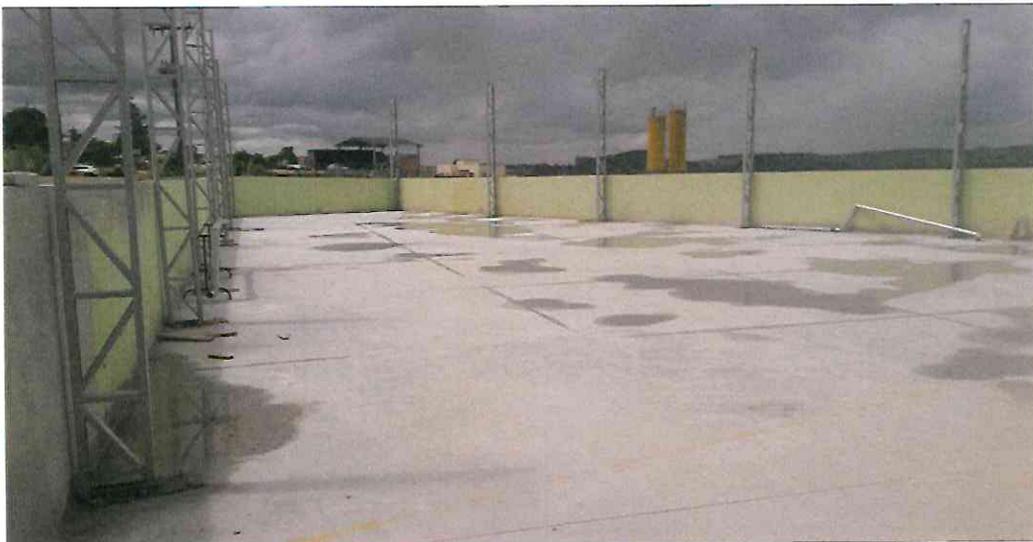

2- Muro – Serviços medidos: Restante de alvenaria e chapisco



3- Passeio Executado
