

CROQUI PARA FINS DE EXECUÇÃO
DE DRENAGEM PRÉ-FABRICADA

(4 x) Sapatas Cabeceiras 3,00x1,00m - h - 40cm - Ø 3/8
Brocas Ø 3/8- 3 furos

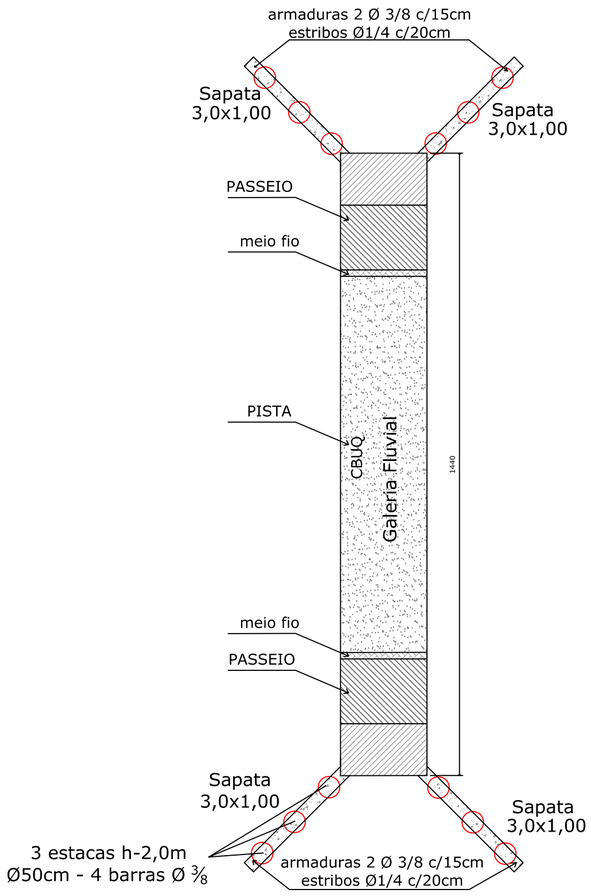

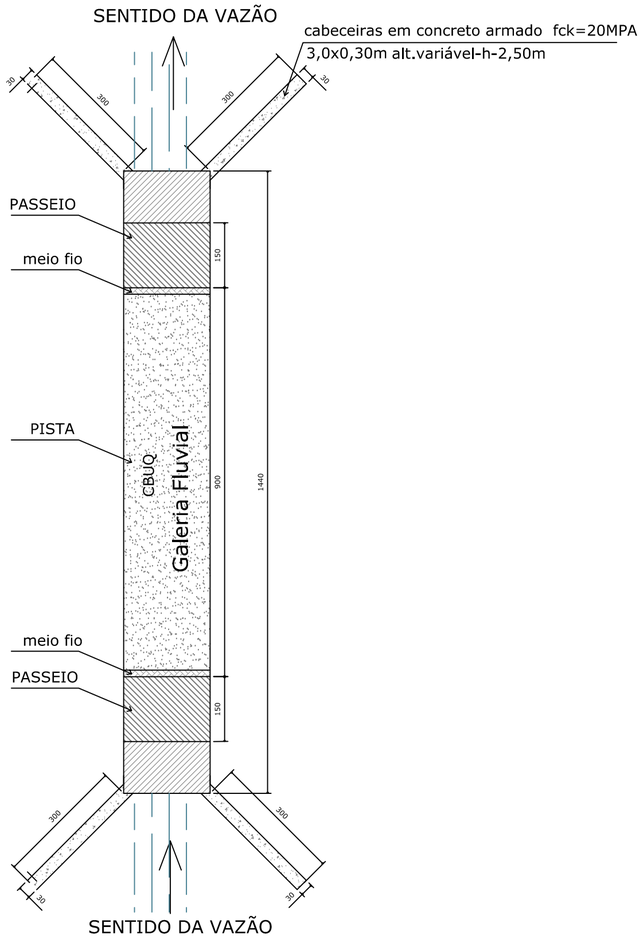

Quantitativo

-Galeria celular 2mx2mx14,4m = 02un.
-Volume de corte galerias = 364,32m³
-Volume de reaterro galerias = 249,12m³
-Lastro concreto para apoio das galerias fluviais h-15cm c/ malha de ferro = 10,50m³
-Pedra de mão rachão (4 alas de cortinas) = 170,00m³
-Capa em concreto sob a galeria (h-10cm) = 7,00m³

GALERIA

PROJETO:
RODOVIA MUNICIPAL ESTANISLAU WILNER \ RODOVIA MUNICIPAL BEN. THEODORO MARTINS STEPHANES - SÃO LOURENÇO - EXTENSÃO 5307,00m
MUNICIPIO DE MAFRA - SANTA CATARINA.

PRANCHA: 03/05

DATA:	DESENHO:	ESCALA:	LEV. TOPOGRÁFICO:	ARQUIVO:
NOV./ 2017	MAYARA	1/100	SOMMER	GALERIA.dwg

RESPONSAVEL TÉCNICO:
